

貳、重要審計案件(議題)

一、保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例內容及審計作為(第二廳報告)

(一)前言

立法院於 115 年 5 月 8 日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」(下稱本條例)，規劃於 8 年期間編列 7,800 億元軍購預算，採購保衛國家安全及強化不對稱戰力之武器及裝備，並明訂審計機關應依法辦理審計，鑑於其預算規模龐鉅且後續推動成效攸關國家安全，又本部過去查核發現軍購制度面、執行面及資源運用效益等面向均有待積極改善之處，為善盡本條例賦予之審計職責，並依「智慧審計、永續審計、韌性審計、共臻善治」等四大面向，系統性規劃未來查核國軍對美軍事採購之精進審計作為，以下謹就本條例內容、本部近年查核成果、未來審計精進作為等，臚述如次：

(二)本條例內容

1. 立法背景

國防部為建置有效嚇阻戰力，依照兵力整建需求，透過軍購、商購及委製等管道陸續籌獲各項武器裝備，建置遠距精準打擊、防空、制海之基本不對稱嚇阻能力，然面對中共近年軍事威脅持續升高，共機擾台頻率已由 2015 年之 4 次，大幅增加至 2025 年之 5,709 次(詳表 1)，其中更有 3,763 架次之共機逾越海

峽中線，共軍灰色襲擾威懾常態化，由演轉戰及封鎖作戰風險持續升高，國軍亟需加速籌獲各項關鍵武器裝備，惟鑑於中央政府總預算

表 1 2015 - 2025 年共機共艦擾台次數統計表

年度	共機擾台次數	共機逾越海峽中線架次	偵獲共艦艘次
2015	4 次	0 架次	無公開統計
2016	4 次	0 架次	無公開統計
2017	34 次	0 架次	無公開統計
2018	13 次	0 架次	無公開統計
2019	20 次	3 架次	無公開統計
2020	380 架次	49 架次	無公開統計
2021	960 架次	數十架次	無公開統計
2022	1,723 架次	564 架次	654 艘次
2023	4,734 架次	1,703 架次	1,915 艘次
2024	5,107 架次	3,070 架次	2,501 艘次
2025	5,709 架次	3,763 架次	2,613 艘次

註:1. 2015 至 2019 年為任務次數，2020 年至 2025 年國防部以架次統計。

2. 資料來源：國防部、國防安全研究院統計、財團法人兩岸交流遠景基金會。

歲出規模有限以及政府各項施政計畫需求，無法將戰備需求全數納入公務預算，以 115 年度為例，軍事投資預算計 1,616 億元，扣除優先支應已簽署合約「持續案」1,532 億元後，僅 84 億元可納新增案項，若僅倚賴年度公務預算籌購所需裝備，全數獲得須耗費多年，將形成戰力缺口且排擠其他後勤維持費年度支出，恐降低防衛作戰韌性，行政院爰於 114 年 11 月 27 日第 3980 次院會，通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，規劃於 122 年底前編列 1 兆 2,500 億元特別預算，涵蓋對美軍購、商購及國內委製等項目，一次性籌建可恃戰力。

2. 立法沿革

行政院將前開特別條例草案送立法院審議後，立法院各黨團相繼提出不同版本，經數度討論協商後，立法院於115年5月8日三讀通過7,800億元版本(詳附件)，並奉總統於同年月11日公布。

3. 本條例主要內容

(1)採購項目與預算：本條例第5條規定採購項目分為兩批次，總預算上限7,800億元：

A. 第一批次：預算上限3,000億元，採購項目包含：M109A7自走砲系統、海馬士多管火箭飛彈系統(HIMARS)、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈。

B. 第二批次：預算上限4,800億元，須於本條例施行後1年內獲美國政府正式同意售予，項目包含：軟、硬殺混合反制無人機系統、各型反彈道及防空飛彈、中低空防空系統、反甲飛彈戰備存量補充案。

(2)預算編列與監督機制

A. 立院事前同意制度：本條例第6條第3項規定，行政院須於本條例通過後1個月內提出專案報告，經立法院同意後始得籌編預算案，立院同意各項專案報告後，行政院應於2個月內將第一批發價書預算案，送立法院審議。

- B. 一年一期編列審議：本條例第 6 條第 2 項規定，採一年一期方式編列，期滿後後續預算及期程，經立法院同意後分期辦理預算籌編審議。
- C. 非經同意不得流用：本條例第 6 條第 1 項及第 7 條第 1 項第 2 款規定，第一批及第二批預算，非經立法院同意，不得相互流用，依預算法第 63 條規定流用前，須經立法院同意。
- D. 定期專報暨總結報告：本條例第 7 條第 2 項及第 4 項規定，主管機關應專案列管及考核本條例所列計畫之執行，並將執行進度及績效，每會期向立法院提出專案報告，本條例施行屆滿之日次年五月底前，就其實施成效作成總結報告送立法院。
- E. 審計機關依法審計：本條例第 7 條第 1 項第 1 款規定，審計部應依法辦理審計。

4. 特別預算案編列情形

國防部依本條例規定，提報第一批項目總經費 2,950 億元，並編製完成「115 年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，歲出編列第一批項目部分經費 88 億元，所需財源全數舉借債務支應，於 115 年 5 月 20 日經行政院第 4003 次會議通過，送請立法院審議。有關 115 年度特別預算案採購項目及內容如下：

- (1) M109A7 自走砲：總經費 806 億餘元，115 年度編列 39 億餘元。
- (2) 海馬士多管火箭飛彈系統：總經費 1,597 億餘元，115 年度編列 27 億餘元。
- (3) 反甲型無人機飛彈系統：總經費 330 億餘元，115 年度編列 17 億餘元。
- (4) 標槍反裝甲飛彈系統：總經費 99 億餘元，115 年度編列 1.6 億餘元。
- (5) 拖式 2B 反裝甲飛彈系統暨戰備存量補充：總經費 116 億餘元，115 年度編列 1.3 億餘元。

(三) 本部近年查核成果

本部近年來持續強化國防部對美軍事採購之查核，在制度面、執行面、財務效益面及陳報監察院等面向均獲致具體審計成果，謹分述如下：

1. 制度面

(1)革新在途物資管制機制，建立軍購案預算保留制度：

促請國防部修訂「國防部所屬機關軍購案支出結報作業要點」，建立軍購案預算保留制度。

(2)軍購備查帳依會計性質允當表達，提升軍購帳務透明度：

促請國防部將現行軍購案備查帳按購建中品項、一號訂單及已供補完成待結案件分類管制，並公開揭露於會計月報及國防部主管決算，提升軍購帳務透明度。

- (3)運用資訊系統強化供補不符案件申請管制機制：促請國防部建立供補不符案件申請管制預警機制，避免供補不符案件，因逾期申請致美方不予受理。
- (4)促請強化軍購案執行進度管控：部分已供補完成案件未依安援手冊期限結案，促請國防部將供補完成案件管制年限由5年縮短為2年，強化進度管控。
- (5)強化國軍軍購管理系統相關購案資訊之及時性及正確性：國防部已訂定「軍購系統登載注意事項」建立逐級覆核機制，強化軍購管理系統登載作業，確保我方系統資訊與美方一致。
- (6)促請強化軍購合約價格稽核機制：美國防合約審計局（DCAA）稽查發現雷神公司虛報軍購價款，經本部促請國防部蒐集美方供售其他國家相同武器裝備之價格進行比價，並蒐集歷史採購價格資訊納入建案文件審查，另協請美方強化軍購案價格稽核機制。

2. 執行面

- (1)促請依軍購執行進度滾動修正調整發價書內容，避免鉅額資金滯存美方，提升資源運用效率：本部查核發現軍購案間有付款期程與裝備交運或服務提供期程未能配合、交運延遲且有交運期程集中於結案前等情事，經促請國防部檢討修訂發價書延後付款期程，及持續透過安全合作對話（SCT）、專案管理會議（PMR）、駐廠連絡官及正式致函美方權責單位等方式要求美方儘速交運。

(2)促請檢討改善零附件及可修件之採購與交運情形，減低對裝備妥善之影響：經運用電腦稽核軟體勾稽比對，國軍對美採購零附件及可修件間有延遲交運及下訂逾 2 年未交運情形，肇致部分料件已無庫存而有欠撥，影響裝備妥善情形；及使用開放式合約下訂一號訂單預建之庫存品項，或以二號訂單申請使用非一號訂單預建之庫存品項等未臻周妥情事，國防部已要求所屬透過安全合作資訊入口網站系統積極掌握美方交運狀況，即時洽美催詢，並依主件裝備現況檢討需求項目修訂一號訂單清單品項，俾增加二號訂單運用彈性，縮短籌補時程，以達支援戰力目標。

(3)促請加速清結老舊購案：查核發現部分軍購案件辦理結匯後，因裝備部分未到貨、廠商財務問題等原因，多年來未能清結，100 年以前已完成供補之老舊購案亦有部分仍未結案。經持續督促國防部加速清結，老舊未結案件已由 106 年底之 40 案降低至 114 年底之 16 案。

3. 財務效益面

本部近年查核軍購案執行情形，產生財務效益案件逾百億元，包含：(1)鳳展專案研發攤費補償 63 億餘元；(2)刪除愛國者系統後勤勤務、天鷹專案及天鷲專案發價書之非特定需求項目，並退匯新臺幣 47 億餘元；(3)促請就 100 年度以前結匯且美方已完成供補之軍購案加速辦理帳務清結，已退匯新臺幣 12 億餘元；(4)雷神公

司虛報軍購價款案溢收之行政管理費 1 億 9 千萬餘元已悉數收回繳庫。

4. 陳報監察院重大軍購案

本部查核軍購案發現未盡職責或效能過低等重大情事，經報請監察院者(均為機密案件)，計有博勝案、P-3C 案、F-16 AESA 雷達案、遊龍案等，其中博勝案及 P-3C 案均經監察院糾正。

(四)未來審計精進作為(結合本部四大業務推動面向)

本廳以過去查核軍購案累積之經驗與成果為基礎，規劃結合「智慧審計」、「永續審計」、「韌性審計」、「共臻善治」等四大面向，研擬未來審計精進作為如下：

1. 智慧審計面向—成立資訊分析小組，廣納多元人才，推動軍購智慧化查核機制

本廳為積極導入數位審計，已成立國防退輔數據審核分析推動小組，並納編外部專家學者，規劃將大數據分析與人工智慧(AI)技術融入軍購案審計規劃與執行，建立智慧化查核機制，強化查核精準度與效率。

(1)成立國防退輔數據審核分析推動小組

本廳已於 115 年 5 月成立「國防退輔數據審核分析推動小組」，由廳長擔任召集人，成員包括聯審會傳審計官、本廳主管同仁 13 員，以及協請第六廳、資訊處各指派 1 員，共 17 名成員，預計於 115 年 7 月底前召開第 1 次小組會議，正式啟動運作。

本小組以大數據分析與 AI 技術輔助審計規劃與執行，強化查核精準度與效率，並以議題討論方式，每年召開 1 至 4 次會議，視議題性質邀請相關領域專家學者與會，凝聚查核共識，從內部強化數位審計能量，提升監督效能與查核深度。

(2) 建立多元領域專家學者資料庫，擴大數據分析小組知識量能

本廳已建立涵蓋外交國防與兩岸關係、美安全合作政策與軍事採購作業管理、國軍主財雲端系統功能建置與推動、通信電子資訊、航太工程與無人載具整合領域、社會發展與勞動環境，以及創新經濟與智慧農業等多元、跨領域之專家學者人才、公民團體資料庫，未來將滾動修正名單，視查核議題邀請相關領域專家與會，提供相關議題政策執行之建議與諮詢意見，聚焦洞察及前瞻性之興革作法，強化審計人員在特定技術領域之查核能量。

(3) 定期運用數位審計篩選異常指標

本廳已建立 9 項軍購案數位審計異常指標(如表 2)，未來將結合國防部每半年提供國軍軍購案執行情形統計表等電子檔案，定期運用資訊技術自動比對軍購案電子表報資料，篩選具有異常特徵之高風險案件。

表 2 軍購案數位審計異常指標

異常指標	篩選條件說明	審計作為
結匯	1. 結匯異常	結匯率大於 100%(結匯值超過發價值)
	2. 退匯異常	退匯率大於 30%
交運	3. 已付款未交運	有結匯值但無交運值
	4. 交運落後	累計交運率小於 50%
結匯及交運	5. 高結匯低交運	結匯率與交運率差額大於 40 個百分點
	6. 高結匯高交運	結匯率及交運率均高於 80%
案款	7. 滯存 FRB	美國聯邦儲備銀行(FRB)餘額占結匯值比率大於 40%
	8. 積欠案款	待平衡支付值大於 0
	9. 全案金額一致性	發價書金額與預算書金額差額

(4)持續導入及運用生成式人工智慧加強查核軍購案執行情形

本部為加速推動數位審計及運用生成式人工智慧，已建置 AuditGPT 智能審計助手，並陸續開發各項應用模組供同仁使用，本廳規劃結合上開 AI 工具及應用模組，運用 PYTHON 及生成式 AI（如 NotebookLM 等工具）等技術工具，以自然語言處理

(NLP) 檢索國防部每季提供之「待清償責任款(ULO)」PDF 檔，比對每季經美方除帳之購案是否符合除帳標準；另加強檢索比對作業維持案件之發價書是否列有未訂定支用範圍及條件之「非特定需求品項」，提升查核效率。

2. 永續審計面向－完善軍購治理，健全財政及國防產業發展

本廳參考 ESG(環境、社會、治理)框架，規劃加強評核本條例通過後對財政環境(E)、國防產業(S)、軍購治理(G)等面向之影響，以期完善軍購治理，發揮軍購資源之長期效益，促進財政及國防產業健全發展。

(1)健全財政環境永續(E)

財政永續面向之查核，旨在評估龐大國防特別預算之編列與執行對整體財政之影響，查核重點包括：

- A. 評估未通過案項後續因應方式之影響：行政院已於115年5月14日第4002次院會決議請國防部針對未納案項，就「是否再提特別條例」、「是否追加預算」或是「採行擴大年度預算規模」等方式儘速回應。未來宜注意若採「追加預算」或「擴大年度預算規模」方式是否排擠軍事投資、作業維持及其他政事支出。
- B. 持續監控美國聯邦儲備銀行(FRB)資金水位：持續監控存放美國聯邦儲備銀行之資金水位，比對帳款餘額與交運進度，避免鉅額資金滯存美方。

(2)促進國防產業永續發展(S)

促進國防產業永續發展面向之查核，旨在評估軍購案及相關配套制度之推動對我國社會發展、國防產業及基礎工業之長期影響，查核重點包括：

- A. 工業合作效益評估：依國防部工業合作作業規定，為建構國防工業能量，並促進民間產業發展，對外採購之國軍軍事投資建案，推動工業合作計畫。未來宜加強查核相關工業合作案之執行成效，是否確實提升國防產業及基礎工業之能量。
- B. 技術移轉成效評估：以 F-16 維修中心設置及相關航空維修技術移轉為例，評估台美合作架構下之技術移轉是否依約履行，影響戰機妥善之關鍵核心能量建置情形，以及是否有效強化我國自主維修能量。

(3)促進軍購良善治理形塑國防持續性戰力(G)

為確保軍購制度及程序健全，促進軍購良善治理，以形塑國防韌性戰力，查核重點包括：

- A. 加強評核全壽期維持成本編列之合理性及執行情形：本條例規定依本條例編列之特別預算案，應載明採購裝備之全壽期維持成本，並提出國軍人員維持、後勤補給支援、資訊通信系統維護之策進作為。未來宜加強評核案內採購裝備「全壽期維持成本」編列之合理性及相關後勤維保資源是

否足以形塑國防持續性戰力。

B. 加強考核重大軍購案交運執行進度：本部查核發現部分軍購案交運期程落後，雖經國防部修訂發價書及建案文件之交運期程，惟仍有部分案件持續落後，且無法依原建案文件規劃期程完成建軍，考量國軍建案係參考美軍計畫預算制度，並依十年建軍構想，規劃五年兵力整建計畫依序完成建案文件，其原建案文件之執行期程攸關國軍整體建軍及兵力整備，未來應加強考核軍購案執行進度落後，致國軍無法依原建案文件規劃之執行期程完成，對國軍建軍備戰之整體影響。

3. 韌性審計面向－強化軍購風險辨識提升國防韌性

本廳規劃以前瞻觀點深化查核我國軍購特別條例執行所涉國防韌性建置情形，協助辨識潛在風險，從傳統危機應對思維轉型為前瞻預警性治理。

(1) 加強查核重大軍購武器裝備使用管理效能，強化防衛韌性


國防部依「多域拒止，重層削弱」之聯合作戰整備方向，規劃建構遠距、精準、機動、致命及人工智慧等不對稱戰力，強化防衛韌性，近年已透過軍購管道籌獲 F-16V 戰機、M1A2T 新式戰車、人攜式刺針飛彈等武器裝備，並透過本條例規劃籌獲海馬士多管火箭飛彈系統、防空及反彈道飛彈等新式武器裝備，建構多層次防衛韌性。未來宜透過各項演習實施成果驗

證報告及專案管制會議等資料，加強查核所獲武器裝備之使用效益與建構防衛韌性之達成情形。

(2)建置軍購風險辨識模型

本廳規劃建立「軍購風險熱區氣泡圖」，將執行中軍購案，按其執行風險（X 軸）及財務風險（Y 軸）進行量化定位，以視覺化方式呈現各軍購案風險程度，協助審計人員精準選案並集中資源於高風險案件。說明如次：

軍購風險熱區氣泡圖

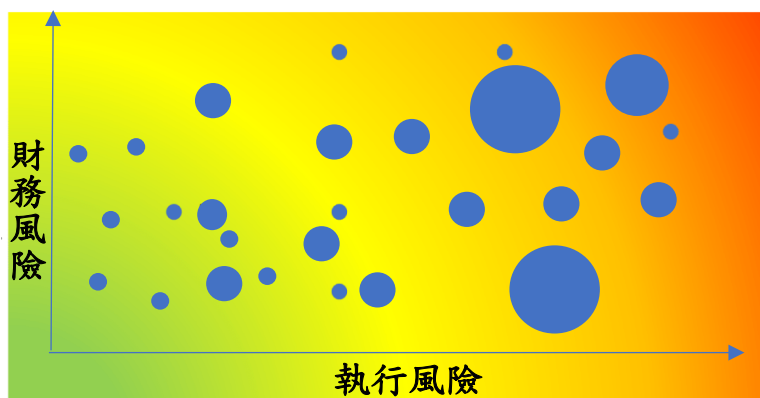

- A. **執行風險（X 軸）**：執行風險由以下 3 項指標合計值構成：(a)結匯率減交運率之差額；(b)發價值減交運值之差額占發價值之比率；(c)有結匯值但無交運值者計為 1，反之為 0。三項指標合計值越高，表示該案交運進度落後、執行風險越大，於風險熱區氣泡圖中位置偏右側。
- B. **財務風險（Y 軸）**：財務風險係由以下 4 項指標合計值構成：(a)FRB 餘額占結匯值之比率；(b)結匯率大於 100%者計為 1，反之為 0；(c)退匯率大於 30%者計為 1，反之為 0；(d)待平衡支付值大於 0 者計為 1，反之為 0。上述 4 項指標合計值越大，

表示該案財務風險越高，於風險熱區氣泡圖中位置偏上方。

C. 氣泡大小表達個案金額：以圖上氣泡呈現每案軍購案規模，並以氣泡大小表達該案金額，視覺化呈現購案規模。

(3)追蹤檢視特別條例未通過案項之因應作為

本條例通過後，國防部已於行政院第 4002 次院會報告說明本條例排除商購及委製案，損及國防建軍完整性及五年兵力整建施政規劃排序，將造成指管決策、全域偵知、高效打擊、防衛韌性等國防戰力缺口，行政院並指示國防部針對未納案項，儘速研擬因應措施。本部未來應追蹤檢視國防部相關因應措施與替代規劃是否足以彌補戰力缺口，避免形成國防戰力空窗。

4. 共臻善治面向－強化利害關係人協力合作，促進軍購良善治理

本廳規劃強化與行政機關、立監兩院及公民等利害關係人之協力合作，共同促進軍購良善治理，推動重點如下。

(1)行政機關－跨域協力合作，強化軍購案管制成效

本廳將持續深化與國防部之夥伴關係，透過跨域協力合作方式，共同促請美合約審計局等單位增加我國軍購案之稽核與查驗頻次，及洽美國防帳務中心、安全合作局等單位研議依財務管理規則，調降美國聯

邦儲備銀行(FRB)資金提領基數之可行性，以維我國權益。

(2)立監兩院—加強查核本條例落實情形，善盡審計職責

本條例明定預算編製非經立法院同意，不得相互流用，並要求行政院每會期提出專案報告，施行期滿作成實施成效總結報告。未來將依本條例規定，加強查核各項經費動支是否符合規定及流用限制、採購程序是否合規等是否符合本條例規定，並加強研析相關專案報告及總結報告之落實情形，以評估其效益，相關查核成果納入總決算審核報告揭露，以善盡審計職責。

(3)公民—促請強化軍購資訊揭露，落實公民課責

囿於軍購案件特殊之帳務處理，整體財務資訊未臻透明，致輿論與立委多有臆測或誤解，無法藉由公眾之瞭解及監督機制，共同促進軍購案之良善治理，未來將持續促請國防部研議在不涉及國家安全機密之前提下，逐年擴大軍購資訊之揭露範圍；另將本部具體查核成果，發行專案審計報告並適時辦理重要審計資訊發布，強化公開透明，增進公民監督能量。

(五) 結語

本條例規劃於8年期間編列7,800億元對美軍購特別預算，規模龐鉅且攸關國家安全，本部過去查核國軍對美軍事採購，已在制度面、執行面、財務效益面及陳報監察院等面向獲致具體審計成果，未來將依

「智慧審計、永續審計、韌性審計、共臻善治」四大面向，強化查核本條例相關軍購案之深度與廣度，確保國防資源運用之效益，積極回應立法院、監察院及社會大眾對審計機關之期待，創造最大審計價值。
